




REGIONE BASILICATA

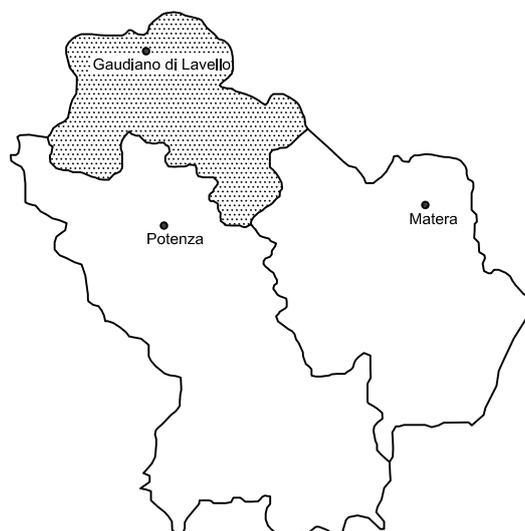

COMPLETAMENTO DEI DISTRETTI IRRIGUI IN AGRO DI MONTEMILONE ED INTEGRAZIONE RISORSE IDRICHE

PROGETTO ESECUTIVO

G-ELABORATI AMMINISTRATIVI

G14.3

Cronoprogramma della sicurezza -
GANTT

Giugno 2014

IL PROGETTISTA

Prof. Ing. A.F. PICCINNI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Fileno PENNACCHIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. G. MUSACCHIO

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2			Mese 3				Me
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10
Fase 1: Allestimento cantiere	11 g										
Allestimento di cantiere temporaneo	8 g	Z1	8								
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g			Z1	3						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g		Z1	3							
Realizzazione della viabilità del cantiere	3 g		Z1	3							
Fase 2: Impianto di sollevamento	74 g										
Scavo di sbancamento	7 g		Z1	7							
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g				Z1	5					
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	5 g				Z1	5					
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g					Z1	1				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	6 g						Z1	6			
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	5 g						Z1	5			
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g							Z1	1		
Installazione di tubazioni, apparecchiature idrauliche e di misu	14 g								Z1	14	
Realizzazione di impianto elettrico interno ed esterno	16 g									Z1	16
Posa di serramenti interni	3 g										
Formazione di pavimentazione stradale in stabilizzato	8 g										
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g										
Posa di recinzioni e cancellate	11 g										
Messa a dimora di piante	3 g										
Fase 3: Premente e opere d'arte	426 g										
Scavo a sezione ristretta	310 g	Z1	310								
Letto di posa e rinfiacco per tubazioni	310 g	Z1	310								
Posa di condotta idrica	310 g	Z1	310								
Rinterro di scavo	310 g	Z1	310								
Pozzetti per scarichi e sfiati	48 g						Z1	7			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2 g						Z1	2			
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	2 g						Z1	2			
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione - Blocchi d	1 g							Z1	1		
Getto di calcestruzzo per briglie in c.a.	2 g										
Perforazioni per pali trivellati per pozzi di spinta e di arrivo	3 g										
Posa ferri di armatura per pali trivellati per pozzi di spinta e di	3 g										
Getto di calcestruzzo per pali trivellati per pozzi di spinta e di	2 g										
Scavo di sbancamento per pozzi di spinta e di arrivo	3 g										

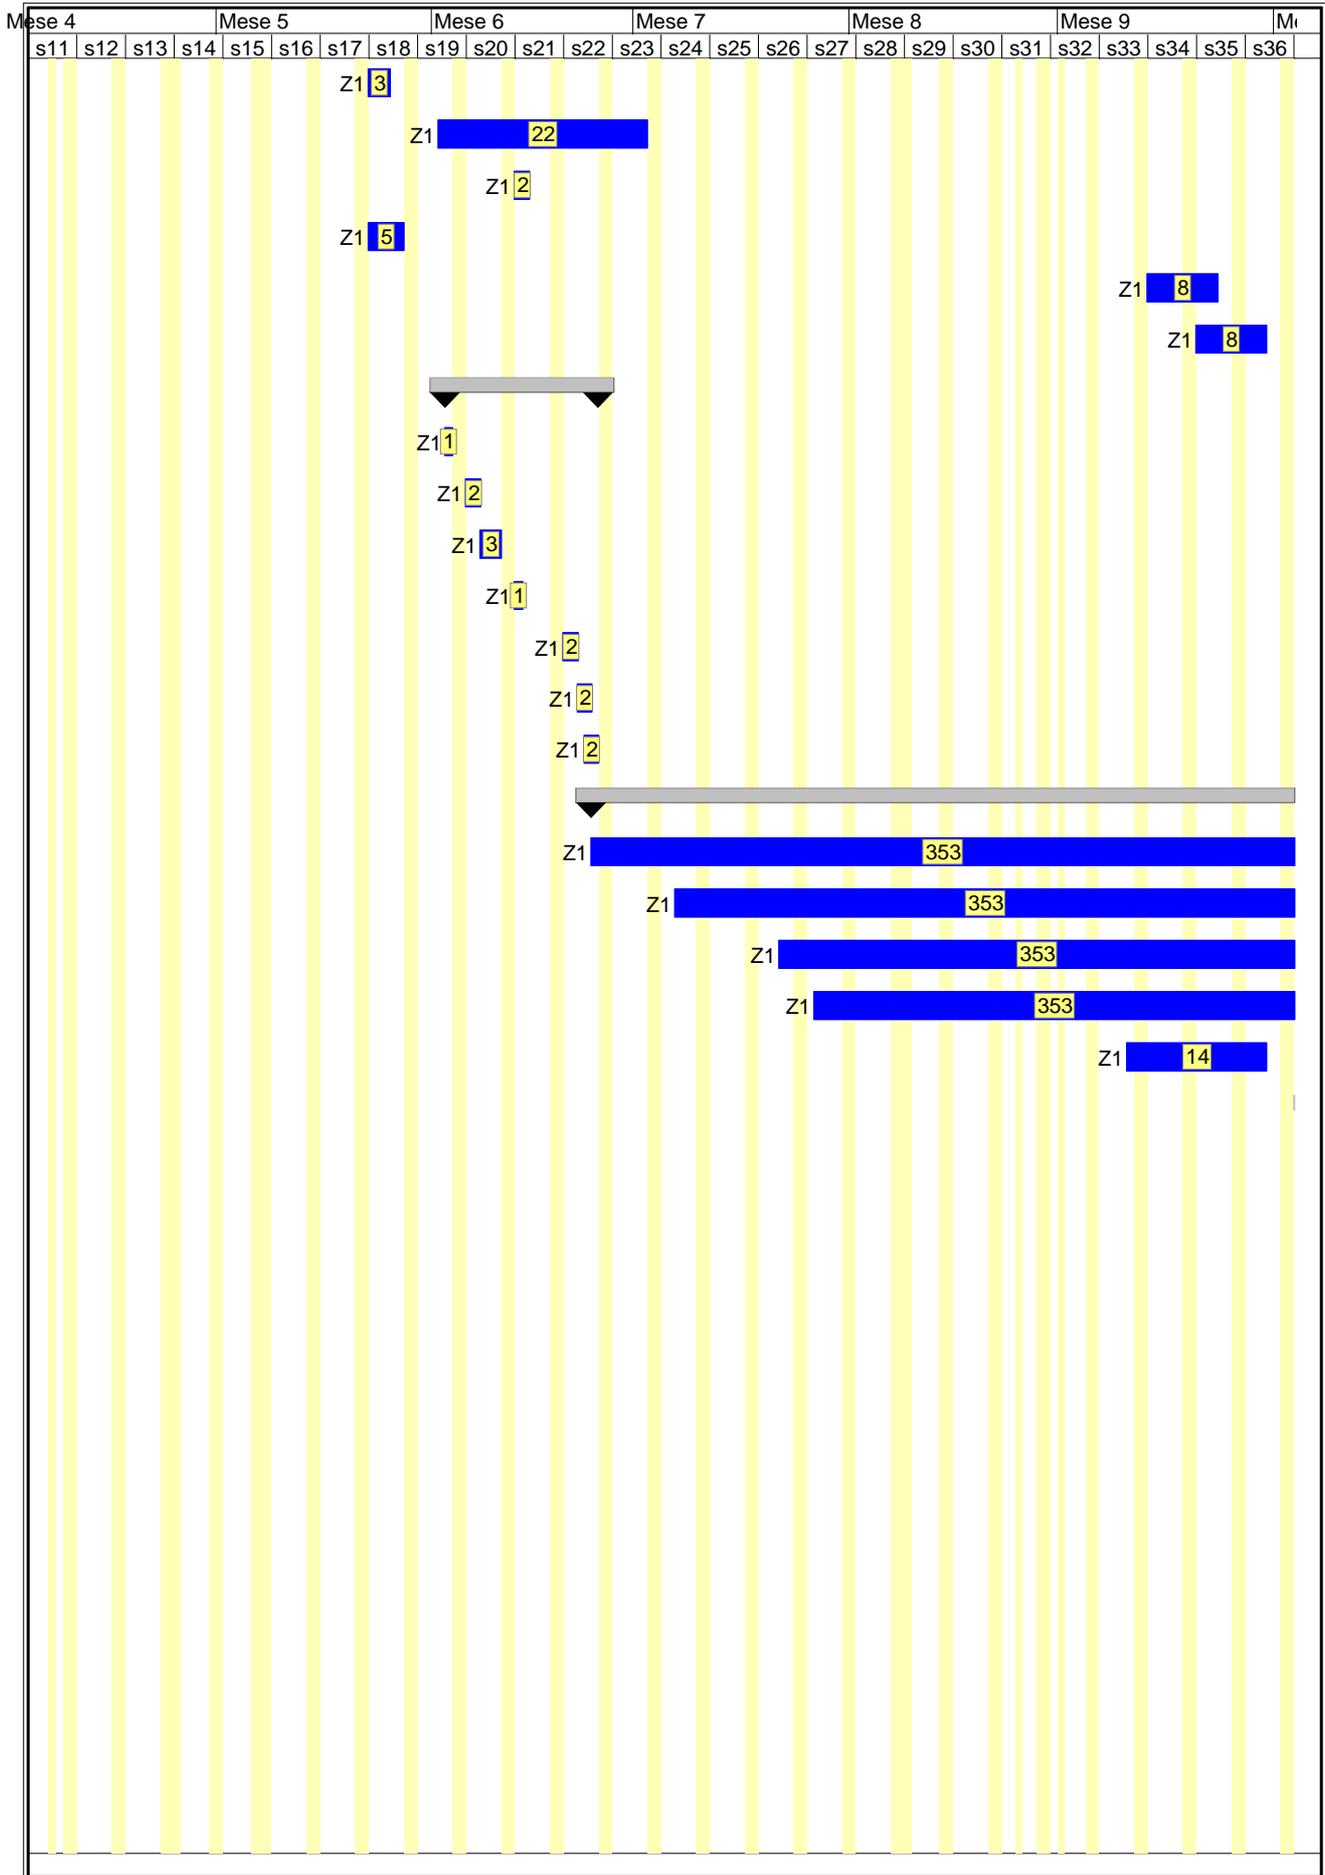

Mese 22				Mese 23				Mese 24				Mese 25				Mese 26				Mese 27				N				
s89	s90	s91	s92	s93	s94	s95	s96	s97	s98	s99	s100	s101	s102	s103	s104	s105	s106	s107	s108	s109	s110	s111	s112	s113	s114			



